

Benza Water Storage SRL
P.I.V.A.: 01060310081 - REA: IM-89732 del 18/01/93
Cod. meccanografico: IM003695
Cap.soc.i.v.: €160.000,00
Sede legale e Operativa: Via Giovanni Pascoli, 163
18038 SANREMO (IM) - ITALY
Deposito grandi volumi: Via Armea snc
TEL. 0184 - 57.52.46 / 0184 - 50.18.55
Internet: www.benza.it - e-mail: preventivi@benza.it

FONDAMENTA SPA (alla c.a.Geom. Michele Mallarino)
Presso Vostro cantiere Eboli/Buccino.
84025 EBOLI (SA)
P.IVA: 01543610180
e-mail: michele.mallarino@fondamentaspa.it

Sanremo, 27/03/2026

OGGETTO: N. 2 VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo Ø12,75 H2,36 + N. 4 VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo Ø6,37 H3,12 + N. 2 VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo Ø9,10 H3,12

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta di preventivo, Vi inviamo la ns. migliore offerta per n° [n_vasche] vasca prefabbricata [modello] con volume nominale di MC [volume_nominale] e **volume utile di MC [volume_utile][elenco_acc]**.

Documentazione COMPRESA nel prezzo:

- Certificazione CE del serbatoio specifico: una copia etichetta già apposta sulla lamiera e una copia fornita insieme con la consegna: da non perdere e da conservare a cura del cliente.
- Tutta la documentazione presente sul ns. sito: <https://www.benza.it/doc-genap-acqua>
 - Tra cui: istruzioni di montaggio, manuale d'uso e manutenzione, certificazione CE EN1090 dell'acciaio, DOP.
- Certificazione antincendio UNI EN 12845:2020
- Relazione antisismica e strutturale conforme alle Normative Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/08 e successivi aggiornamenti con DM 17/01/2018 e relativi allegati numerici di calcolo e proiezioni tridimensionali (per redigere tale relazione necessitiamo dapprima di quella geologica a Vs. cura e spesa),
- Progetto esecutivo, compresa la platea/cordolo di cemento di base e relativi ancoraggi a terra.

Condizioni di servizio ed esplicite esclusioni documentali

Tempo di elaborazione e preparazione dei documenti ingegneristici: 30 gg. lav.

Le tavole di progetto esecutive unitamente alla relazione di calcolo e gli allegati di calcolo sono fornite in formato P7M e PDF (con e senza firma digitale) e rappresentano documenti progettuali completi ed esaustivi per la realizzazione della vasca, della platea e degli ancoraggi. I documenti sono forniti una sola volta dopo l'accettazione del contratto e il relativo pagamento.

Ogni qualsiasi tipo di variante o documentazione aggiuntiva è da ritenersi NON inclusa nella presente offerta.

Esclusioni documentali:

A titolo di esempio NON esaustivo elenchiamo alcune delle principali esclusioni: presentazione dei documenti al Catasto e/o al Genio Civile o sui portali telematici di Comuni, Province, Regioni o Comunità autonome, collaudo strutturale con sopralluogo ingegnere, compilazione della modulistica per il deposito dei calcoli, suddivisione dei files in più moduli per la presentazione dei documenti, asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale, asseverazione del geologo, asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica, relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento, relazione geologica, relazione geotecnica, relazione sui materiali impiegati, relazione sulle opere di fondazione, planimetria generale, progetto architettonico, relazione tecnica dell'impianto e ogni altro documento non esplicitamente compreso o già pubblicato sul ns. sito.

A RICHIESTA:

Variando la tipologia di telo impermeabile, è possibile richiedere test e dichiarazione di conformità per acqua potabile (DM n° 174 del 06/04/2004). La certificazione EN 10204 della minuteria (bulloni, dadi, rondelle, staffe di ancoraggio a terra) deve essere richiesta PRIMA dell'ordine, poiché in un momento successivo alla consegna o al montaggio potrebbe non essere più possibile reperirla, oppure potrebbe comportare tempi di attesa molto lunghi. Ulteriore documentazione suppletiva potrebbe essere fornita su Vs. gradita richiesta, ove possibile, comunque a seguito di un'analisi della richiesta stessa nonché della stima di tempo necessario per la compilazione e della conseguente specifica determinazione del compenso per il professionista iscritto agli albi professionali: la documentazione verrà quindi a Voi inviata tramite mail o PEC, in formato pdf con e senza firma digitale, in formato cartaceo se richiesto, previo pagamento anticipato del corrispettivo pattuito.

La fornitura comprende (Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo) per ogni serbatoio:


- n° 42 lamiere ondulate di acciaio zincato di lunghezza 3 m altezza 82 cm di cui 28 lamiere di spessore 0.8 mm, 14 lamiere di spessore 1.0 mm comprensiva di bulloneria (1098 dadi e bulloni, rondelle) per il montaggio della struttura
- Telo impermeabile Genap® in polipropilene PP poliolefine AQUATEX® EX 0,6 mm.
- Tessuti protettivi per il fondo e per le pareti
- n° 14 Staffe di ancoraggio a terra a "L", bulloni e tasselli compresi
- Flangia di rinforzo per fori laterali nella lamiera ondulata, max DN200 mm.
- Attacco conico presaldato in fabbrica e relativi nastri per il fissaggio per tubi da 90 a 200 mm.
- Piastra antivortice laterale, passaggio parete centro tubo h 41 cm. da terra per tubi Ø150=mm.160=6"

La fornitura NON comprende: (Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo)

Esclusioni: collaudo con sopralluogo ingegnere, tutte le tubazioni e la raccorderia, fondazione con platea di cemento armato, valvole, centraline per il controllo di livello con sonde, galleggiante per ingresso acqua da sopra, collari e altri accessori, impianto di riscaldamento o movimento acqua, passi d'uomo, tetto in acciaio, scaldiglia, scale alla marinara o altre tipologie, 1° Anello plastificato, Plastificazione completa, copertura, Tubo di rinforzo in cima, Piletta per troppo pieno, Indicatore di livello, Succhieruola, Scala con gabbia e tutto quanto non espressamente indicato.

Documentazione fotografica (Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo)





Le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative.

La fornitura comprende (Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo) per ogni serbatoio:

- n° 28 lamiere ondulate di acciaio zincato di lunghezza 3 m altezza 82 cm di spessore 1.0 mm comprensiva di bulloneria (728 dadi e bulloni, rondelle) per il montaggio della struttura
- Telo impermeabile Genap® in polipropilene PP poliolefine AQUATEX® EX 0,6 mm.
- Tessuti protettivi per il fondo e per le pareti
- n° 8 Staffe di ancoraggio a terra a "L", bulloni e tasselli compresi
- Flangia di rinforzo per fori laterali nella lamiera ondulata, max DN200 mm.
- Attacco conico presaldato in fabbrica e relativi nastri per il fissaggio per tubi da 90 a 200 mm.
- Piastra antivortice laterale, passaggio parete centro tubo h 41 cm. da terra per tubi Ø150=mm.160=6"

La fornitura NON comprende: (Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo)

Esclusioni: collaudo con sopralluogo ingegnere, tutte le tubazioni e la raccorderia, fondazione con platea di cemento armato, valvole, centraline per il controllo di livello con sonde, galleggiante per ingresso acqua da sopra, collari e altri accessori, impianto di riscaldamento o movimento acqua, passi d'uomo, tetto in acciaio, scaldiglia, scale alla marinara o altre tipologie, 1° Anello plastificato, Plastificazione completa, copertura, Tubo di rinforzo in cima, Piletta per troppo pieno, Indicatore di livello, Succhieruola, Scala con gabbia e tutto quanto non espressamente indicato.

Documentazione fotografica (Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo)



Le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative.

La fornitura comprende (Vasca 3 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo) per ogni serbatoio:


- n° 40 lamiere ondulate di acciaio zincato di lunghezza 3 m altezza 82 cm di spessore 0.8 mm comprensiva di bulloneria (1040 dadi e bulloni, rondelle) per il montaggio della struttura

- b. Telo impermeabile Genap® in polipropilene PP poliolefine AQUATEX® EX 0,6 mm.
- c. Tessuti protettivi per il fondo e per le pareti
- d. n° 10 Staffe di ancoraggio a terra a "L", bulloni e tasselli compresi
- e. Flangia di rinforzo per fori laterali nella lamiera ondulata, max DN200 mm.
- f. Attacco conico presaldato in fabbrica e relativi nastri per il fissaggio per tubi da 90 a 200 mm.
- g. Piastra antivortice laterale, passaggio parete centro tubo h 41 cm. da terra per tubi Ø150=mm.160=6"

La fornitura NON comprende: (Vasca 3 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo)

Esclusioni: collaudo con sopralluogo ingegnere, tutte le tubazioni e la raccorderia, fondazione con platea di cemento armato, valvole, centraline per il controllo di livello con sonde, galleggiante per ingresso acqua da sopra, collari e altri accessori, impianto di riscaldamento o movimento acqua, passi d'uomo, tetto in acciaio, scaldiglia, scale alla marinara o altre tipologie, 1° Anello plastificato, Plastificazione completa, copertura, Tubo di rinforzo in cima, Piletta per troppo pieno, Indicatore di livello, Succhieruola, Scala con gabbia e tutto quanto non espressamente indicato.

Documentazione fotografica (Vasca 3 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo)

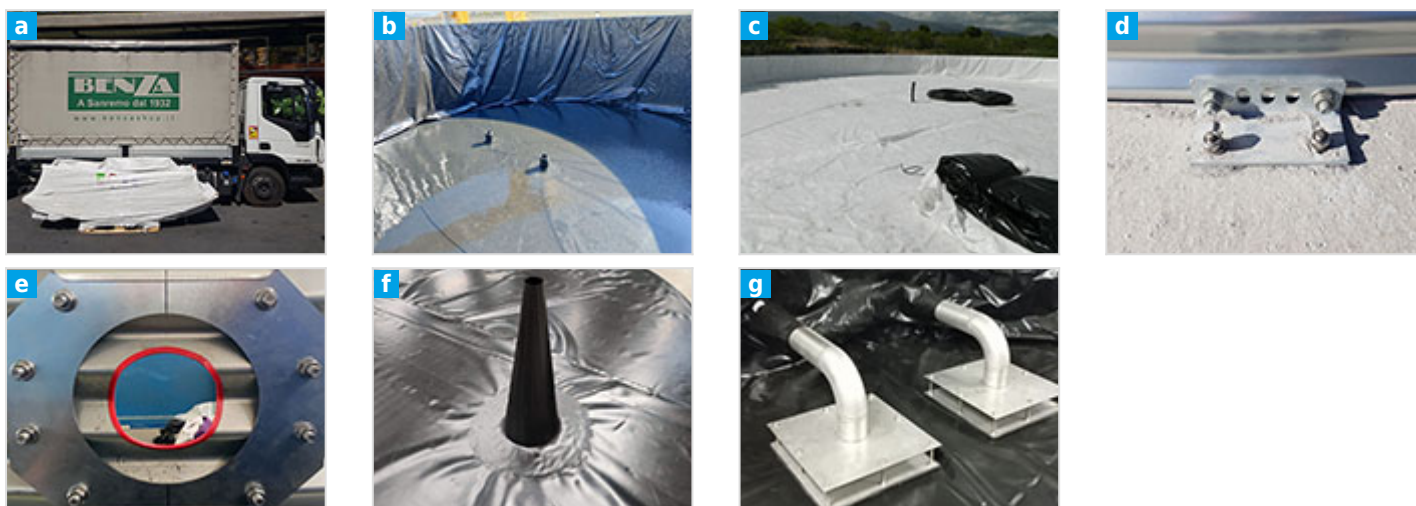

Le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative.

Offerta fornitura materiali

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unit.	Totale
Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo (x2)			
Serbatoio di acciaio Genap®	2	10.089,00 €	20.178,00 €
Telo impermeabile 10 anni garanzia	2	807,12 €	1.614,00 €
Tessuti per fondo e pareti	2	605,34 €	1.210,00 €
Staffe di ancoraggio	28	53,00 €	1.484,00 €
Flangia di rinforzo fori	2	200,00 €	400,00 €
Attacco conico	2	300,00 €	600,00 €
Piastra antivortice	2	1.900,00 €	3.800,00 €
Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo (x4)			
Serbatoio di acciaio Genap®	4	12.103,00 €	48.412,00 €
Telo impermeabile 10 anni garanzia	4	Compreso	Compreso
Tessuti per fondo e pareti	4	Compreso	Compreso
Staffe di ancoraggio	32	Compreso	Compreso
Flangia di rinforzo fori	4	200,00 €	800,00 €
Attacco conico	4	300,00 €	1.200,00 €
Piastra antivortice	4	1.900,00 €	7.600,00 €
Vasca 3 - VASCA GENAP® MOD.BASE Uso temporaneo (x2)			
Serbatoio di acciaio Genap®	2	8.829,00 €	17.658,00 €
Telo impermeabile 10 anni garanzia	2	706,32 €	1.412,00 €
Tessuti per fondo e pareti	2	529,74 €	1.058,00 €
Staffe di ancoraggio	20	53,00 €	1.060,00 €
Flangia di rinforzo fori	2	200,00 €	400,00 €
Attacco conico	2	300,00 €	600,00 €
Piastra antivortice	2	1.900,00 €	3.800,00 €
Subtotale Fornitura			113.286,00 €
Trasporto cumulativo			2.500,00 €
Progettazione esecutiva			4.600,00 €
DEDOTTO TRASPORTO A VS. CURA E SPESA c/ritiro c/o Ravera (SV)			-1.100,00 €
Supplemento spessore lamiera 1 mm			485,00 €
Telo aggiuntivo di riserva (totale teli: 3)			1.436,40 €
Trasporto del telo aggiuntivo da Olanda			250,00 €
Totale Imponibile			121.457,40 €
IVA 22%			26.720,63 €
TOTALE FORNITURA (IVA inclusa)			148.178,03 €

Termini di consegna: Ritiro c/o Fratelli Ravera 1896 Regione Rapalline 14 - 17031 Campochiesa (SV)

Pagamento: 40% BB anticipato, all'ordine + 60% BB anticipato a 30 gg DRF dalla data di spedizione.

Installazione e posa

A Vs. scelta potete optare per una delle seguenti offerte:

Opzione A: Assistenza alla posa in opera con 1 ns. tecnico + 5 Vs. operai presenti in loco.

Assistenza 1 tecnico - lavoro (4 gg)	0,00 €
Assistenza 1 tecnico - viaggio (2 gg)	0,00 €
Vitto e alloggio (6 gg)	0,00 €
Indennita trasferta (6 gg)	0,00 €
Rimborso chilometrico (922 km)	0,00 €
Totale IVA esclusa	0,00 €
IVA 22%	0,00 €
Totale Ivato	0,00 €

Opzione B: Offerta posa in opera con 4 tecnici specializzati con DPI, documenti di cantiere e relativi patentini.

Installazione 4 tecnici - lavoro (4 gg)	0,00 €
Installazione 4 tecnici - viaggio (2 gg)	0,00 €
Affitto PLE (4 gg)	0,00 €
Trabatelli, attrezzi	0,00 €
Redazione documenti	0,00 €
Vitto e alloggio (6 gg)	0,00 €
Indennita trasferta (6 gg)	0,00 €
Rimborso chilometrico (922 km)	0,00 €
Totale IVA esclusa	0,00 €
IVA 22%	0,00 €
Totale Ivato	0,00 €

Condizioni di installazione:

NON VERRA' INIZIATA LA POSA IN OPERA QUALORA NON SIA DISPONIBILE SUBITO L'ACQUA PER IL RIEMPIMENTO.

Pagamento: la posa in opera deve essere saldata PRIMA della partenza dei tecnici. Il prezzo sopra esposto in tabella rappresenta una stima a forfait. Tuttavia, al fine di tutelare ambo i contraenti nonché garantire la certezza della spesa, il prezzo resterà valido sia nel caso in cui il tempo di posa risultasse inferiore, sia nel caso in cui risultasse maggiore, ma con un margine massimo di variazione del 100% (il doppio): se per qualsiasi ragione o imprevisto, la tempistica di posa risultasse più che doppia, la ditta Benza avrà diritto ad addebitare le giornate supplementari, al prezzo giornaliero esposto in tabella.

Preavviso: qualora desideraste avvalervi del ns. supporto alla posa, occorrerà programmare l'intervento con un preavviso di almeno 30 giorni. Prima di iniziare il viaggio e prenotare aerei/automezzi/traghetti, necessitiamo di foto dello stato dei luoghi, al fine di verificare la corretta predisposizione del cantiere.

Documentazione: Nel caso in cui la presenza dei tecnici in cantiere richiedesse particolari documentazioni oltre a quelle considerabili standard o consuete (DURC, DUVRI, DVR, RCT, RCO, POS, CCIAA, patentini), il cliente dovrà comunicarlo con almeno 30 giorni di anticipo e ciò potrebbe comportare ulteriori spese, da quantificarsi a seconda di ciò che sarà preteso. Il cliente dovrà avvisare anche nel caso in cui sul cantiere fossero richieste ulteriori particolari esigenze al fine di ottemperare alle normative di sicurezza, supplementari rispetto a quelle considerabili standard o consuete (per esempio, necessità di gru o particolari DPI, necessità di patentini per lavori in quota oppure per lavori in spazi confinati).

Comunque ogni documento necessario dovrà sempre essere comunicato per iscritto con 30 giorni di anticipo, qualsiasi esso sia.

Condizioni di installazione: l'installazione NON DEVE essere eseguita in caso di pioggia, neve, grandine, temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 30°C e soprattutto in caso di venti superiori ai 20 Km/h. Si suggerisce pertanto di **scegliere con cura il periodo di lavoro in base alle previsioni meteo.**

In caso di stop per motivi a noi non imputabili come ad esempio appunto il maltempo, verranno comunque addebitati i costi giornalieri lavorativi aggiuntivi e le relative spese di vitto e alloggio. I tecnici Genap o Benza, a propria discrezione, possono decidere di interrompere il montaggio per ragioni di sicurezza dei lavoratori o per assicurare l'integrità delle merci fornite.

Luogo di installazione: il luogo dove montare il serbatoio deve essere idoneo alla posa, raggiungibile per l'installazione e la successiva manutenzione, nonché protetto dall'eventuale incendio: distante da fonti di calore ovvero oggetti incendiabili quali alberi o arbusti (se necessario, eseguire una pulizia del territorio circostante). Il terreno non deve essere cedevole e permettere al serbatoio di restare perfettamente in piano (si suggerisce di eseguire dapprima una analisi geologica).

Preparazione del cantiere: all'arrivo del/i tecnico/i, il cantiere dovrà risultare pronto; il cliente dovrà fare trovare in cantiere:

- 1) Gli operai richiesti, dalle 8 del mattino alle 8 di sera per i giorni necessari.
- 2) Camion Gru patente C, se richiesto (sempre necessario per coperture con palo centrale).
- 3) 10 sacchi da 25 Kg. di sabbia fiume per ovviare ad eventuali imperfezioni nelle pendenze della platea.
- 4) Base di appoggio pronta (platea o cordolo), con tubazioni già predisposte come da progetto.

In caso di errori nella preparazione della platea e delle tubazioni di fondo, il tecnico di fabbrica che verrà dall'Olanda per cambiare il posizionamento degli scarichi di fondo già saldati nel telo impermeabile avrà un costo di **€ 2.500,00 + IVA**.

La platea (o cordolo) dovrà essere realizzata in maniera tale da permettere l'impiego dei trabattelli, spostandoli attorno alla struttura.

A vasca installata dovrà essere subito possibile riempirla con acqua per almeno 40 cm. al fine di evitare che il vento possa far sbattere il telo impermeabile di contenimento o che possa addirittura spostare la struttura in lamiera.

E' pertanto necessario che le tubazioni di fondo siano già dotate di valvole di chiusura o di intercettazione all'esterno.

- 5) Acqua pronta per il riempimento immediato dopo la posa in opera di ogni serbatoio.
- 6) Energia elettrica a 230 Volts (e relative prolunghe ed eventuali riduzioni CEE/SHUKO se necessarie) per avere la corrente vicino alle vasche o generatore di corrente per far funzionare gli avvitatori. 2 avvitatori verranno portati dai tecnici, se fosse possibile averne altri sarebbe meglio (la posa potrebbe risultare più rapida), ma non indispensabile. Possono risultare utili sia avvitatori a impulsi sia ad aria compressa o pistole avvitatrici.
- 7) 2 trabattelli con ruote altezza minima del piano di calpestio 2 metri e 4 scale doppie. In caso non poteste mettere a disposizione scale e trabattelli, energia elettrica o aria compressa potremmo provvedere al costo di **€ 500 + IVA al giorno**.
- 8) Tubi e raccordi per la copertura, ove necessari (se il diametro del serbatoio è maggiore di 7 metri).
- 9) I materiali forniti e tutti quelli necessari per terminare l'opera.
- 10) Spazio sufficiente per permettere l'installazione, il montaggio di dadi e bulloni con gli avvitatori, l'entrata e l'uscita dentro e fuori il serbatoio. Ciò è particolarmente importante laddove si lavorasse in spazi ristretti, angusti e confinati, quali seminterrati o cantine: dovranno essere tenuti in considerazione ad esempio pilastri portanti, spessore della platea d'appoggio e altezza da terra al soffitto. Pertanto è compito del cliente verificare preliminarmente che lo spazio a disposizione sia sufficiente.

Esclusioni: tutto ciò che non riguarda il solo ed esclusivo montaggio della struttura del serbatoio, sarà a cura e spesa del cliente o del Suo impiantista.

Per esempio, la ditta Benza non si occupa di collegamenti elettrici in quanto è opportuno che tali lavorazioni siano affidate a un tecnico del posto.

L'installazione del serbatoio comprende pertanto solo l'assemblaggio delle lamiere con la bulloneria ed il posizionamento del telo impermeabile (compresa nastratura scarichi). Anche la messa in sicurezza del cantiere è a cura e spesa del committente (esempio: recinzioni ove necessarie).

Le staffe di ancoraggio a terra dovranno essere tassellate a metà riempimento e, poiché il riempimento del serbatoio è a cura e spesa del cliente, di conseguenza lo sarà anche la successiva tassellatura a terra; qualora invece desideraste la staffatura a terra post-riempimento da parte ns. sarà sufficiente pagare le giornate di lavoro aggiuntive e le relative spese di vitto e alloggio (cosa che non consigliamo: i tecnici dovrebbero solo attendere il riempimento per poi martellare a terra i tasselli).

Esclusioni dagli oneri della sicurezza: ad esclusione dei DPI e dell'abbigliamento di sicurezza, tutti gli altri oneri della sicurezza saranno a cura e spesa del cliente, quali a titolo di esempio non esaustivo: recinzioni, nastri segnaletici per delimitazioni, riunioni di coordinamento per lavori interferenti, trabattelli, piattaforme, sollevatori, parapetti, barriere in cls, barriere in PE, portali in legno, protezione scavi, linee vita, funi di sicurezza, corde di ancoraggio, catene, segnaletica, coni a strisce bianche e rosse, barelle, estintori, sorveglianza, semafori, lampeggianti, unità di decontaminazione, nuclei abitativi per servizi di cantiere, wc chimici.

Subappalto: i tecnici potrebbero essere in subappalto. Qualora il cliente non fosse d'accordo, dovrebbe segnalarlo al momento dell'ordine e ciò potrebbe comportare ulteriori costi.

Nulla vieta, per risparmiare, che installiate in proprio il serbatoio seguendo foto, figure, filmati presenti sul ns. sito (operazione svolta con facilità da oltre il 90% della ns. clientela), nonché procedendo secondo le istruzioni di montaggio o la progettazione esecutiva ove fornita. Purché siano seguite correttamente le istruzioni di montaggio (e in seguito il manuale d'uso e manutenzione), la garanzia non decade: non è necessario che sia un team/tecnico Genap/Benza a installare il serbatoio, per godere della garanzia di fabbrica sui materiali.

Condizioni di vendita e garanzie:

Pagamento: bonifico bancario anticipato, per far partire la produzione su misura in fabbrica.

IBAN: IT 04 0 02008 22700 000004681839

(5 zeri nell'ultima serie, 11 zeri in totale, dopo "04" c'è la lettera "O" di Otranto, non il numero zero)
da intestare a: "Benza Water Storage SRL" con causale "Pagamento vasca"

Scadenza del preventivo: 30 gg. solari.

Termini di consegna della documentazione, se richiesta: ca. 30 gg. lav. **NOTA BENE:** la documentazione (quali certificazioni, dichiarazioni di conformità e schede tecniche) deve essere richiesta PRIMA della conferma dell'ordine della merce. Potrebbe non essere possibile soddisfare richieste successive alla fornitura o all'installazione del serbatoio. Il committente si assume ogni responsabilità penale e civile riguardante la verifica, l'idoneità e la completezza della documentazione stessa. La richiesta di ulteriori documenti necessari, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali permessi, autorizzazioni o omologazioni, è onere esclusivo del committente, il quale, con l'accettazione del presente ordine, dichiara di aver esaminato e ritenuto congrua la documentazione fornita e, pertanto, manleva fin d'ora il fornitore da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata o tardiva richiesta di documenti essenziali, obbligatori o specifici, anche successiva all'installazione o al montaggio, riconoscendone la piena assunzione di ogni rischio e responsabilità al riguardo.

Termini di consegna dei materiali: [tempi_consegna]. La ditta Benza non può essere ritenuta responsabile nel caso raro in cui il corriere, scioperi, cause di forza maggiore o qualsiasi altra ragione (es.: coronavirus) potessero causare ritardi nella consegna. Non si accettano pertanto penali e non verranno rimborsate spese sostenute durante l'attesa della consegna. Il costo del trasporto comprende solo l'arrivo a destino, lo scarico normalmente effettuabile mediante muletto o mezzo meccanico è a cura e spesa del cliente. Quando ancora imballata, la merce deve essere custodita in luogo asciutto, al riparo da agenti esterni e da infestazioni di roditori o altri animali nocivi, adottando ogni misura necessaria a prevenirne l'accesso, il danneggiamento o l'alterazione.

Penali: non sono accettate penali di alcun genere, in nessun caso. Sarà compito del cliente organizzare il proprio lavoro con un margine d'anticipo sufficiente a compensare qualsivoglia eventuale imprevisto, fosse anche solo un ritardo da parte del corriere. Qualsiasi penale concordata tra il cliente e i terzi, vincolerà solo ed esclusivamente il cliente nei confronti di tali terze parti, senza alcun diritto del cliente di rivalersi sulla ditta Benza.

Varianti all'ordine: una volta inoltrato l'ordine in fabbrica, qualsiasi successiva variazione (del materiale ordinato e/o nell'indirizzo di spedizione) può comportare importanti incrementi di prezzo, spese impreviste e/o significativi ritardi nella consegna.

Esclusioni: come precedentemente specificate alle pagine precedenti di questa offerta.

Certificazioni: sul sito Internet alla pagina <https://www.benza.it/doc-genap-acqua> è possibile reperire gran parte delle certificazioni, istruzioni, documentazioni, piano di manutenzione, schede tecniche etc. Qualora fossero richiesti ulteriori particolari documenti per il Vs. specifico caso (raro; esempio: certificazioni americane), se ne dovrà rendere nota la necessità PRIMA dell'acquisto. In caso contrario, le documentazioni già presenti sul ns. sito e quelle fornite secondo normative (UNIEN12845 e NTC 2018) saranno da considerarsi valide e complete a tutti gli effetti.

Disegni esecutivi (compresa la progettazione della platea di cemento), **certificazioni antincendio, relazione di calcolo antisismica e strutturale:** verranno redatti secondo le normative italiane vigenti e forniti DOPO l'ordine d'acquisto. **NOTA BENE:** è essenziale disporre della relazione geologica (a Vs. cura e spesa), per poter redigere la conseguente relazione di calcolo antisismica e strutturale.

Permessi: è compito del cliente ottemperare a tutti gli obblighi normativi in termini di permessi catastali e urbanistici. Spiegazioni su certificazioni, domande tecniche, catasto e urbanistica: <https://www.benza.it/consegne#tabFAQ1>

Volume utile: è compito del cliente individuarlo, si offre quanto richiesto. La capacità antincendio secondo la norma UNI-EN 12845:2020 è calcolata in configurazione senza pozzetto, quota tra pelo libero e bordo vasca pari a 6 cm., Ø nominale della tubazione di aspirazione pari a 150 mm.

La garanzia è decrescente per mese: <https://www.benza.it/consegne#tab6>

Garanzie: 2 anni sul Modello Base, 3 anni sul Modello Antincendio, 5 Anni sul Modello Alta Qualità per impiego con sansa o altri liquidi compatibili, 5 anni sul Modello chiuso GenaflexStore, 5 anni sul modello per liquami o digestato, 10 anni sul Modello Alta Qualità per impiego con acqua.

La corretta installazione e manutenzione assicurano al serbatoio una vita utile di gran lunga superiore alla garanzia.

DURATA STIMATA da ns. esperienza pluridecennale sul campo, per tutti i modelli, CON CORRETTA INSTALLAZIONE: almeno 15-20 anni.

Istruzioni di montaggio: <https://www.benza.it/istruzioni-montaggio-vasche>

Manuale di uso e manutenzione: https://www.benza.it/allegati/certificazioni/manuale_uso_e_manutenzione.pdf

Garanzie GENAP® di fabbrica sui materiali: la garanzia copre tutti i vizi di fabbricazione dell'acciaio e relativi componenti, delle plastiche e relative saldature. Il materiale verrà fornito nuovo e in perfetto stato, privo di difetti e, in caso di difetto (evento raro), ogni parte verrà prontamente sostituita in maniera gratuita. Per danni marginali (esempio: un piccolo foro nel telo), ci si riserva di riparare la parte danneggiata senza sostituire l'intero pezzo. Eventuali vizi dei materiali dopo la consegna degli stessi dovranno essere segnalati per iscritto entro 15 gg. solari dal ricevimento della merce.

Sul cliente ricade l'obbligo di custodia e manutenzione dei beni dalla consegna alla posa in opera e durante il loro utilizzo prolungato nel tempo.

In nessun caso le ditte Benza e/o Genap potranno essere ritenute responsabili per: qualsiasi danno in conseguenza di difetti o rotture di una o più vasche, danni a cose e/o persone e/o animali e/o danni di immagine e/o lucro cessante e/o spese sostenute in attesa di una riparazione o di una consegna.

La garanzia è valida solo se sono seguiti scrupolosamente: istruzioni di montaggio, progetto esecutivo, manuale d'uso e manutenzione.

La garanzia è valida solo dopo la prima installazione: disinstallazioni e re-installazioni successive alla prima posa in opera non sono coperti da garanzia.

La garanzia non è equiparabile a un'assicurazione (a Vs. cura e spesa) pertanto copre il valore delle merci fornite, non danni secondari o collaterali.

La garanzia DECADE TOTALMENTE se la vasca non è riempita per almeno 40 cm. SUBITO DOPO la fine del montaggio.

La garanzia DECADE TOTALMENTE se la vasca non è riempita per intero entro 72 ore dalla fine del montaggio, perché non può resistere al vento vuota.

La garanzia DECADE TOTALMENTE se la vasca non è installata entro 6 mesi dalla consegna e/o se non correttamente custodita nel frattempo.

La garanzia NON copre i danni causati dal vento per serbatoi con altezze oltre 3,5 metri e/o lasciate vuote o parzialmente vuote e/o in fase di costruzione.

La garanzia NON copre costi di trasporto, trasferta e manodopera di personale specializzato che dovesse intervenire per eventuali riparazioni.

La garanzia NON copre inoltre: rimborso di spese in termini di perdite d'acqua, danni meccanici, danni da trascinamento, danni causati a sé stessi o ad altri da parte degli installatori o manovali o operai o lavoratori in generale, per imperizia, incuria o negligenza o inosservanza delle normative di sicurezza sul luogo di lavoro; errori durante l'installazione da parte di terzi o dal cliente, danni causati da terzi o dal cliente o da mezzi meccanici, automezzi o elicotteri, atti vandalici ed eventi socio politici, danni dovuti ad agenti corrosivi o eccessiva umidità, danni causati da eventi naturali quali alluvioni, scoppio e incendio, vento, terremoti o cause di forza maggiore in generale; danni dovuti ad installazioni di coperture, tubi di scarico, adduzione o troppo pieno.

In caso di perdite d'acqua, non vi è nessuna garanzia se il cliente ha scelto di ordinare più di 3 allacci ai tubi nel telo impermeabile. Su qualsiasi modifica strutturale o alterazione apportata in loco (comprese flange laterali) o non come da progettazione esecutiva o difformi dalla fornitura di fabbrica, non vi è alcuna garanzia. Qualsiasi foro praticato nelle lamiere è a rischio e pericolo del committente, anche se realizzato da tecnici Genap/Benza.

Per l'installazione in spazi confinati, scantinati o simili, la manutenzione deve prevedere idonei sistemi al fine di evitare la formazione di condensa o umidità sulle lamiere (in caso di luoghi chiusi e/o umidi è possibile ordinare lamiere completamente plastificate).

Tempistiche di intervento per operazioni in garanzia: i tempi di risoluzione di eventuali problematiche per operazioni in garanzia possono variare a seconda dei tempi di produzione delle componenti necessarie all'intervento e non sono pertanto del tutto prevedibili (sebbene si possano stimare circa 30 gg. al massimo per la produzione dei pezzi); ci si riserva comunque un tempo di intervento di minimo 15 gg. dalla richiesta del committente, anche per operazioni che non richiedano sostituzione della componentistica.

Condizioni di installazione: l'installazione NON DEVE essere eseguita in caso di pioggia, neve, grandine, temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 30°C e soprattutto in caso di venti superiori ai 20 Km/h. Si suggerisce pertanto di scegliere con cura il periodo di lavoro in base alle previsioni meteo.

Foto: ove presenti, le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative, non sono legalmente vincolanti e potrebbero non corrispondere esattamente alle misure e/o quantità e/o colori e/o pezzi effettivamente forniti. Molte altre foto e video sono reperibili sul sito: <https://www.benza.it/>

Foro competente: Tribunale di Imperia.

Restituire firmato e timbrato qui sotto per accettazione,
insieme con copia bonifico d'acconto, per far partire l'ordine.

TIMBRO E FIRMA CLIENTE*: _____

*Timbro e firma non bastano: l'ordine verrà inoltrato in fabbrica quando sarà stato visualizzato l'accredito sul conto corrente.
