

Benza Water Storage SRL
P.I.V.A.: 01060310081 - REA: IM-89732 del 18/01/93
Cod. meccanografico: IM003695
Cap.soc.i.v.: €160.000,00
Sede legale e Operativa: Via Giovanni Pascoli, 163
18038 SANREMO (IM) - ITALY
Deposito grandi volumi: Via Armea snc
TEL. 0184 - 57.52.46 / 0184 - 50.18.55
Internet: www.benza.it - e-mail: preventivi@benza.it

Netafim Italia

P.IVA: 00204520993
C.F.: 03107250106
Tel: 0185929419
roberto.foglietta@netafim.orbia.com
16035 Rapallo (GE)

Sanremo, 10 Agosto 2026, 17:40

OGGETTO: N. 1 VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 99 MC Ø6,37 H3,12 + N. 1 VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 73 MC Ø5,46 H3,12

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta di preventivo, Vi inviamo la ns. migliore offerta per n° 1 vasca prefabbricata VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale con volume nominale di MC 99 e **volume utile di MC 88** (aspirazione max DN200), n° 1 vasca prefabbricata VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale Uso Agricoltura con volume nominale di MC 73 e volume utile di **MC 65** (aspirazione max DN200).



Pallet misure cm.82x280h50 imballato e aperto

Documentazione COMPRESA nel prezzo:

- Certificazione CE del serbatoio specifico: una copia etichetta già apposta sulla lamiera e una copia fornita insieme con la consegna: da non perdere e da conservare a cura del cliente.
- Tutta la documentazione presente sul ns. sito: <https://www.benza.it/doc-genap-acqua>
 - Tra cui: istruzioni di montaggio, manuale d'uso e manutenzione, certificazione CE EN1090 dell'acciaio, DOP.
- Certificazione antincendio UNI EN 12845:2020
- Relazione antisismica e strutturale conforme alle Normative Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/08 e successivi aggiornamenti con DM 17/01/2018 e relativi allegati numerici di calcolo e proiezioni tridimensionali (per redigere tale relazione necessitiamo dapprima di quella geologica a Vs. cura e spesa),
- Progetto esecutivo, compresa la platea/cordolo di cemento di base e relativi ancoraggi a terra.

Condizioni di servizio ed esplicite esclusioni documentali

Tempo di elaborazione e preparazione dei documenti ingegneristici: 30 gg. lav.

Le tavole di progetto esecutive unitamente alla relazione di calcolo e gli allegati di calcolo sono fornite in formato P7M e PDF (con e senza firma digitale) e rappresentano documenti progettuali completi ed esaustivi per la realizzazione della vasca, della platea e degli ancoraggi. I documenti sono forniti una sola volta dopo l'accettazione del contratto e il relativo pagamento.

Ogni qualsiasi tipo di variante o documentazione aggiuntiva è da ritenersi NON inclusa nella presente offerta.

Esclusioni documentali:

A titolo di esempio NON esaustivo elenchiamo alcune delle principali esclusioni: presentazione dei documenti al Catasto e/o al Genio Civile o sui portali telematici di Comuni, Provincie, Regioni o Comunità autonome, collaudo strutturale con sopralluogo ingegnere, compilazione della modulistica per il deposito dei calcoli, suddivisione dei files in più moduli per la presentazione dei documenti, asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale, asseverazione del geologo, asseverazione dell'estensore della relazione geotecnica, relazione illustrativa e scheda sintetica dell'intervento, relazione geologica, relazione geotecnica, relazione sui materiali impiegati, relazione sulle opere di fondazione, planimetria generale, progetto architettonico, relazione tecnica dell'impianto e ogni altro documento non esplicitamente compreso o già pubblicato sul ns. sito.

A RICHIESTA:

Variando la tipologia di telo impermeabile, è possibile richiedere test e dichiarazione di conformità per acqua potabile (DM n° 174 del 06/04/2004). La certificazione EN 10204 della minuteria (bulloni, dadi, rondelle, staffe di ancoraggio a terra) deve essere richiesta PRIMA dell'ordine, poiché in un momento successivo alla consegna o al montaggio potrebbe non essere più possibile reperirla, oppure potrebbe comportare tempi di attesa molto lunghi. Ulteriore documentazione suppletiva potrebbe essere fornita su Vs. gradita richiesta, ove possibile, comunque a seguito di un'analisi della richiesta stessa nonché della stima di tempo necessario per la compilazione e della conseguente specifica determinazione del compenso per il professionista iscritto agli albi professionali: la documentazione verrà quindi a Voi inviata tramite mail o PEC, in formato pdf con e senza firma digitale, in formato cartaceo se richiesto, previo pagamento anticipato del corrispettivo pattuito.


La fornitura comprende (Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 99 MC):

- a. n° 28 lamiere ondulate di acciaio zincato di lunghezza 3 m altezza 82 cm di spessore 1.0 mm comprensiva di bulloneria (728 dadi e bulloni, rondelle) per il montaggio della struttura
- b. Tessuti protettivi per il fondo e per le pareti
- c. n° 7 Staffe di ancoraggio a terra a "L", bulloni e tasselli compresi
- d. Telo impermeabile Genap® in polipropilene PP poliolefine AQUATEX® EX 0,6 mm.
- e. Rete di copertura anti-alghe in tensione, permeabile alla pioggia, dotata di asole rondelle ed elastici per il fissaggio
- f. n° 2 Attacco conico presaldato in fabbrica e relativi nastri per il fissaggio per tubi da 90 a 200 mm.

La fornitura NON comprende: (Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA'' Uso industriale 99 MC)

Esclusioni: collaudo con sopralluogo ingegnere, tutte le tubazioni e la raccorderia, fondazione con platea di cemento armato, valvole, centraline per il controllo di livello con sonde, galleggiante per ingresso acqua da sopra, collari e altri accessori, impianto di riscaldamento o movimento acqua, passi d'uomo, tetto in acciaio, scaldiglia, scale alla marinara o altre tipologie, 1° Anello plastificato, Plastificazione completa, Tubo di rinforzo in cima, Piletta per troppo pieno, Flangia di rinforzo fori, Indicatore di livello, Succhieruola, Piastra antivortice, Scala e tutto quanto non espressamente indicato.

Documentazione fotografica (Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 99 MC)

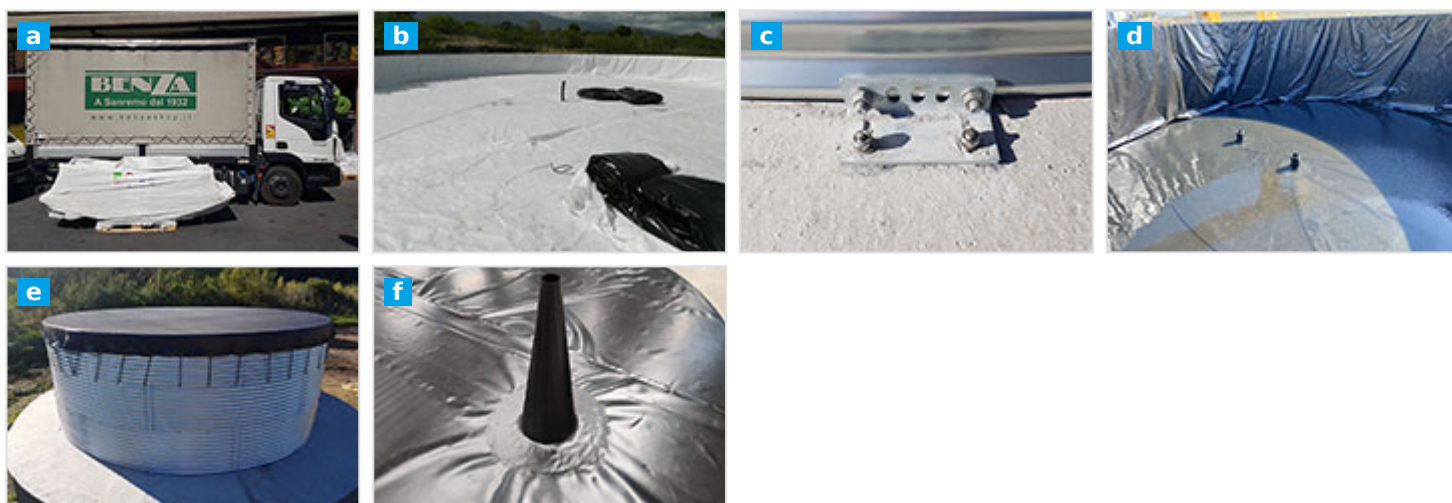

Le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative, non sono legalmente vincolanti e potrebbero non corrispondere esattamente alle misure e/o quantità e/o colori e/o pezzi effettivamente forniti. Molte altre foto e video sono reperibili sul sito: www.benza.it


La fornitura comprende (Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 73 MC):

- a. n° 24 lamiere ondulate di acciaio zincato di lunghezza 3 m altezza 82 cm di spessore 1.0 mm comprensiva di bulloneria (624 dadi e bulloni, rondelle) per il montaggio della struttura
- b. Tessuti protettivi per il fondo e per le pareti
- c. n° 6 Staffe di ancoraggio a terra a "L", bulloni e tasselli compresi
- d. Telo impermeabile Genap® in polipropilene PP poliolefine AQUATEX® EX 0,6 mm.
- e. Rete di copertura anti-alghe in tensione, permeabile alla pioggia, dotata di asole rondelle ed elastici per il fissaggio
- f. n° 2 Attacco conico presaldato in fabbrica e relativi nastri per il fissaggio per tubi da 90 a 200 mm.

La fornitura NON comprende: (Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA'' Uso industriale 73 MC)

Esclusioni: collaudo con sopralluogo ingegnere, tutte le tubazioni e la raccorderia, fondazione con platea di cemento armato, valvole, centraline per il controllo di livello con sonde, galleggiante per ingresso acqua da sopra, collari e altri accessori, impianto di riscaldamento o movimento acqua, passi d'uomo, tetto in acciaio, scaldiglia, scale alla marinara o altre tipologie, 1° Anello plastificato, Plastificazione completa, Tubo di rinforzo in cima, Piletta per troppo pieno, Flangia di rinforzo fori, Indicatore di livello, Succhieruola, Piastra antivortice, Scala e tutto quanto non espressamente indicato.

Documentazione fotografica (Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 73 MC)

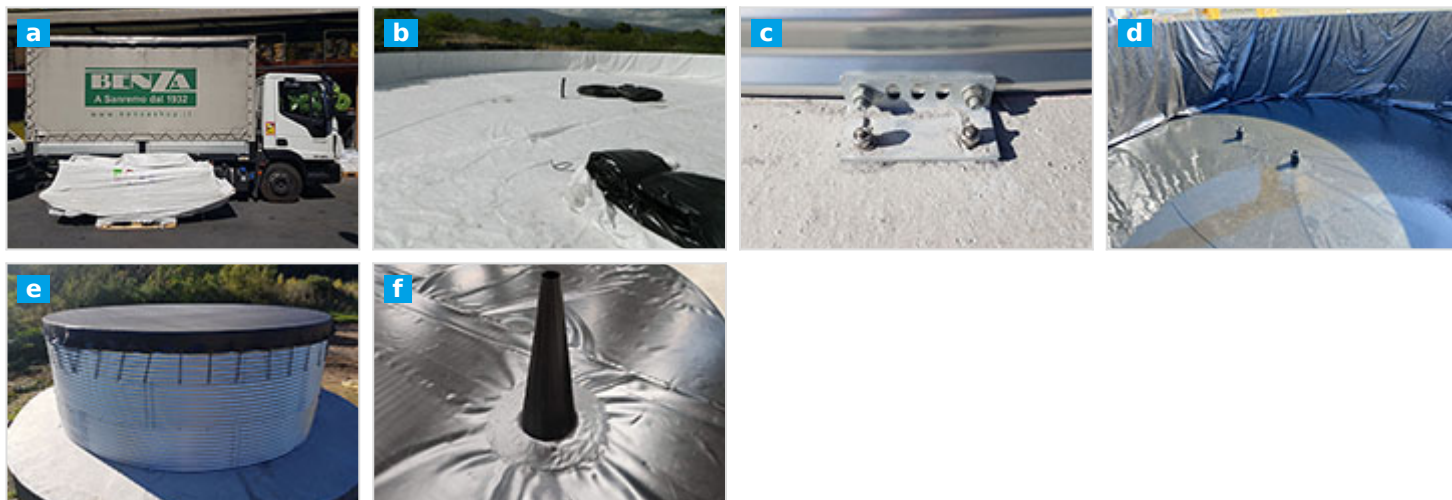

Le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative, non sono legalmente vincolanti e potrebbero non corrispondere esattamente alle misure e/o quantità e/o colori e/o pezzi effettivamente forniti. Molte altre foto e video sono reperibili sul sito: www.benza.it

Offerta fornitura materiali

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Totale
Vasca 1 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 99 MC			
Serbatoio di acciaio Genap®	1	14.497,00 €	14.497,00 €
Tessuti per fondo e pareti	1		Compreso
Staffe di ancoraggio	7		Compreso
Supplemento telo garanzia 10 anni (anziché 2)	1		Compreso
Copertura in tensione	1		Compreso
Attacco conico	2	300,00 €	600,00 €
Vasca 2 - VASCA GENAP® MOD.ALTA QUALITA' Uso industriale 73 MC			
Serbatoio di acciaio Genap®	1	12.580,00 €	12.580,00 €
Tessuti per fondo e pareti	1		Compreso
Staffe di ancoraggio	6		Compreso
Supplemento telo garanzia 10 anni (anziché 2)	1		Compreso
Copertura in tensione	1		Compreso
Attacco conico	2	300,00 €	600,00 €
Subtotale			28.277,00 €
Sconto 5%			-1.413,85 €
Sconto 2%			-537,26 €
<i>Subtotale scontato</i>			26.325,89 €
Trasporto a Vs. cura e spesa			
Progettazione esecutiva			1.000,00 €
Totale Imponibile			27.325,89 €
IVA 22%			6.011,70 €
TOTALE FORNITURA (IVA inclusa)			33.337,58 €

Termini di consegna dei materiali: 7 settimane per la produzione + 1 settimana per la consegna.

Pagamento: Bonifico bancario anticipato, per far partire la produzione su misura.

Condizioni di vendita e garanzie:

Pagamento: Bonifico bancario anticipato, per far partire la produzione su misura.

IBAN: IT 04 0 02008 22700 000004681839

(5 zeri nell'ultima serie, 11 zeri in totale, dopo "04" c'è la lettera "O" di Otranto, non il numero zero)
da intestare a: "Benza Water Storage SRL" con causale "Pagamento vasca"

Scadenza del preventivo: 15 gg. solari.

Termini di consegna della documentazione, se richiesta: ca. 30 gg. lav. **NOTA BENE:** la documentazione (quali certificazioni, dichiarazioni di conformità e schede tecniche) deve essere richiesta PRIMA della conferma dell'ordine della merce. Potrebbe non essere possibile soddisfare richieste successive alla fornitura o all'installazione del serbatoio. Il committente si assume ogni responsabilità penale e civile riguardante la verifica, l'idoneità e la completezza della documentazione stessa. La richiesta di ulteriori documenti necessari, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali permessi, autorizzazioni o omologazioni, è onere esclusivo del committente, il quale, con l'accettazione del presente ordine, dichiara di aver esaminato e ritenuto congrua la documentazione fornita e, pertanto, manleva fin d'ora il fornitore da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata o tardiva richiesta di documenti essenziali, obbligatori o specifici, anche successiva all'installazione o al montaggio, riconoscendone la piena assunzione di ogni rischio e responsabilità al riguardo.

Termini di consegna dei materiali: 7 settimane per la produzione + 1 settimana per la consegna. La ditta Benza non può essere ritenuta responsabile nel caso raro in cui il corriere, scioperi, cause di forza maggiore o qualsiasi altra ragione (es.: coronavirus) potessero causare ritardi nella consegna. Non si accettano pertanto penali e non verranno rimborsate spese sostenute durante l'attesa della consegna. Il costo del trasporto comprende solo l'arrivo a destino, lo scarico normalmente effettuabile mediante muletto o mezzo meccanico è a cura e spesa del cliente. Quando ancora imballata, la merce deve essere custodita in luogo asciutto, al riparo da agenti esterni e da infestazioni di roditori o altri animali nocivi, adottando ogni misura necessaria a prevenirne l'accesso, il danneggiamento o l'alterazione.

Penali: non sono accettate penali di alcun genere, in nessun caso. Sarà compito del cliente organizzare il proprio lavoro con un margine d'anticipo sufficiente a compensare qualsivoglia eventuale imprevisto, fosse anche solo un ritardo da parte del corriere. Qualsiasi penale concordata tra il cliente e i terzi, vincolerà solo ed esclusivamente il cliente nei confronti di tali terze parti, senza alcun diritto del cliente di rivalersi sulla ditta Benza.

Variante all'ordine: una volta inoltrato l'ordine in fabbrica, qualsiasi successiva variazione (del materiale ordinato e/o nell'indirizzo di spedizione) può comportare importanti incrementi di prezzo, spese impreviste e/o significativi ritardi nella consegna.

Esclusioni: come precedentemente specificate alle pagine precedenti di questa offerta.

Certificazioni: sul sito Internet alla pagina <https://www.benza.it/doc-genap-acqua> è possibile reperire gran parte delle certificazioni, istruzioni, documentazioni, piano di manutenzione, schede tecniche etc. Qualora fossero richiesti ulteriori particolari documenti per il Vs. specifico caso (raro; esempio: certificazioni americane), se ne dovrà rendere nota la necessità PRIMA dell'acquisto. In caso contrario, le documentazioni già presenti sul ns. sito e quelle fornite secondo normative (UNIEN12845 e NTC 2018) saranno da considerarsi valide e complete a tutti gli effetti.

Disegni esecutivi (compresa la progettazione della platea di cemento), **certificazioni antincendio, relazione di calcolo antisismica e strutturale:** verranno redatti secondo le normative italiane vigenti e forniti DOPO l'ordine d'acquisto. **NOTA BENE:** è essenziale disporre della relazione geologica (a Vs. cura e spesa), per poter redigere la conseguente relazione di calcolo antisismica e strutturale.

Permessi: è compito del cliente ottemperare a tutti gli obblighi normativi in termini di permessi catastali e urbanistici. Spiegazioni su certificazioni, domande tecniche, catasto e urbanistica: <https://www.benza.it/consegne#tabFAQ1>

Volume utile: è compito del cliente individuarlo, si offre quanto richiesto. La capacità antincendio secondo la norma UNI-EN 12845:2020 è calcolata in configurazione senza pozzetto, quota tra pelo libero e bordo vasca pari a 6 cm., Ø nominale della tubazione di aspirazione pari a 150 mm.

La garanzia è decrescente per mese: <https://www.benza.it/consegne#tab6>

Garanzie: 2 anni sul Modello Base, 10 anni sul Modello Antincendio, 5 Anni sul Modello Alta Qualità per impiego con sansa o altri liquidi compatibili, 5 anni sul Modello chiuso GenaflexStore, 5 anni sul modello per liquami o digestato, 10 anni sul Modello Alta Qualità per impiego con acqua.

La corretta installazione e manutenzione assicurano al serbatoio una vita utile di gran lunga superiore alla garanzia.

DURATA STIMATA da ns. esperienza pluridecennale sul campo, per tutti i modelli, CON CORRETTA INSTALLAZIONE: almeno 15-20 anni.

Istruzioni di montaggio: <https://www.benza.it/istruzioni-montaggio-vasche>

Manuale di uso e manutenzione: https://www.benza.it/allegati/certificazioni/manuale_uso_e_manutenzione.pdf

Garanzie GENAP® di fabbrica sui materiali: la garanzia copre tutti i vizi di fabbricazione dell'acciaio e relativi componenti, delle plastiche e relative saldature. Il materiale verrà fornito nuovo e in perfetto stato, privo di difetti e, in caso di difetto (evento raro), ogni parte verrà prontamente sostituita in maniera gratuita. Per danni marginali (esempio: un piccolo foro nel telo), ci si riserva di riparare la parte danneggiata senza sostituire l'intero pezzo.

Eventuali vizi dei materiali dopo la consegna degli stessi dovranno essere segnalati per iscritto entro 15 gg. solari dal ricevimento della merce. Sul cliente ricade l'obbligo di custodia e manutenzione dei beni dalla consegna alla posa in opera e durante il loro utilizzo prolungato nel tempo.

In nessun caso le ditte Benza e/o Genap potranno essere ritenute responsabili per: qualsiasi danno in conseguenza di difetti o rotture di una o più vasche, danni a cose e/o persone e/o animali e/o danni di immagine e/o lucro cessante e/o spese sostenute in attesa di una riparazione o di una consegna.

La garanzia è valida solo se sono seguiti scrupolosamente: istruzioni di montaggio, progetto esecutivo, manuale d'uso e manutenzione.

La garanzia è valida solo dopo la prima installazione: disinstallazioni e re-installazioni successive alla prima posa in opera non sono coperti da garanzia.

La garanzia non è equiparabile a un'assicurazione (a Vs. cura e spesa) pertanto copre il valore delle merci fornite, non danni secondari o collaterali.

La garanzia DECADE TOTALMENTE se la vasca non è riempita per almeno 40 cm. SUBITO DOPO la fine del montaggio.

La garanzia DECADE TOTALMENTE se la vasca non è riempita per intero entro 72 ore dalla fine del montaggio, perché non può resistere al vento vuota.

La garanzia DECADE TOTALMENTE se la vasca non è installata entro 6 mesi dalla consegna e/o se non correttamente custodita nel frattempo.

La garanzia NON copre i danni causati dal vento per serbatoi con altezze oltre 3,5 metri e/o lasciate vuote o parzialmente vuote e/o in fase di costruzione.

La garanzia NON copre costi di trasporto, trasferta e manodopera di personale specializzato che dovesse intervenire per eventuali riparazioni.

La garanzia NON copre inoltre: rimborso di spese in termini di perdite d'acqua, danni meccanici, danni da trascinamento, danni causati a sé stessi o ad altri da parte degli installatori o manovali o operai o lavoratori in generale, per imperizia, incuria o negligenza o inosservanza delle normative di sicurezza sul luogo di lavoro; errori durante l'installazione da parte di terzi o dal cliente, danni causati da terzi o dal cliente o da mezzi meccanici, automezzi o elicotteri, atti vandalici ed eventi sociali politici, danni dovuti ad agenti corrosivi o eccessiva umidità, danni causati da eventi naturali quali alluvioni, sciopio e incendio, vento, terremoti o cause di forza maggiore in generale; danni dovuti ad installazioni di coperture, tubi di scarico, adduzione o troppo pieno.

In caso di perdite d'acqua, non vi è nessuna garanzia se il cliente ha scelto di ordinare più di 3 allacci ai tubi nel telo impermeabile. Su qualsiasi modifica strutturale o alterazione apportata in loco (comprese flange laterali) o non come da progettazione esecutiva o difformi dalla fornitura di fabbrica, non vi è alcuna garanzia. Qualsiasi foro praticato nelle lamiere è a rischio e pericolo del committente, anche se realizzato da tecnici Genap/Benza.

Per l'installazione in spazi confinati, scantinati o simili, la manutenzione deve prevedere idonei sistemi al fine di evitare la formazione di condensa o umidità sulle lamiere (in caso di luoghi chiusi e/o umidi è possibile ordinare lamiere completamente plastificate).

Tempistiche di intervento per operazioni in garanzia: i tempi di risoluzione di eventuali problematiche per operazioni in garanzia possono variare a seconda dei tempi di produzione dei componenti necessarie all'intervento e non sono pertanto del tutto prevedibili (sebbene si possano stimare circa 30 gg. al massimo per la produzione dei pezzi); ci si riserva comunque un tempo di intervento di minimo 15 gg. dalla richiesta del committente, anche per operazioni che non richiedano sostituzione della componentistica.

Condizioni di installazione: l'installazione NON DEVE essere eseguita in caso di pioggia, neve, grandine, temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 30°C e soprattutto in caso di venti superiori ai 20 Km/h. Si suggerisce pertanto di scegliere con cura il periodo di lavoro in base alle previsioni meteo.

Foto: ove presenti, le foto mostrate nella presente offerta sono puramente esemplificative, non sono legalmente vincolanti e potrebbero non corrispondere esattamente alle misure e/o quantità e/o colori e/o pezzi effettivamente forniti. Molte altre foto e video sono reperibili sul sito: <https://www.benza.it/>

Foro competente: Tribunale di Imperia.

Restituire firmato e timbrato qui sotto per accettazione,
insieme con copia bonifico d'acconto, per far partire l'ordine.

TIMBRO E FIRMA CLIENTE*:

*Timbro e firma non bastano: l'ordine verrà inoltrato in fabbrica quando
sarà stato visualizzato l'accredito sul conto corrente.

Dott. Davide Benza

BENZA WATER STORAGE SRL
Via Pascoli, 163 - SANREMO
Tel. 0184-501855/575246
Partita IVA 01060310081
